Project-plan-v1.0



ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

ONOMA	AM	email	ΕΤΟΣ
			_
Βελγάκης Ιωάννης	1047071	up10477071@upnet.gr	8
Κοκονέλης Ανδρέας	1064949	up1064949@upnet.gr	6
Πιτσιγαυδάκης Εμμανουήλ	1054405	up1054405@upnet.gr	7
Φέλιος Ιωάννης	1047086	up1047086@upnet.gr	8

Περιεχόμενα


ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:	
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	3
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Gantt	3
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ	4
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT	4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	5
ΒΕΛΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5
ΦΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5
ΚΟΚΟΝΕΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ	5
ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	5
ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ	6
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ	6

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ЕРГО	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	ENAPEH	ΛΗΞΗ
CheckInn	102	20/2/23	2/6/23

Task				
A/A	ПЕРІГРАФН ТАЅК	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ENAPEH	VHEH
1	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ	3	20/2/23	22/2/23
2	ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ	2	23/2/23	24/2/23
3	ΠΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ	2	25/2/23	26/2/23
4	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	3	27/2/23	1/3/23
5	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ	1	2/3/23	2/3/23
6	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ MOCK UPS	5	3/3/23	7/3/23
7	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	10	8/3/23	17/3/23
8	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ	8	18/3/23	25/3/23
9	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	8	22/3/23	29/3/23
10	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up	5	30/3/23	3/4/23
11	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Check-In	5	4/4/23	8/4/23
12	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	8	9/4/23	16/4/23
13	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	8	15/4/23	22/4/23
14	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up	8	23/4/23	30/4/23
15	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ CHECK-IN	8	1/5/23	8/5/23
16	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	8	9/5/23	16/5/23
17	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI	8	17/5/23	24/5/23
18	ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-GUI	5	25/5/23	29/5/23
19	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ	1	30/5/23	30/5/23
20	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΓΗ	1	31/5/23	31/5/23
21	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1	1/6/23	1/6/23
22	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1	2/6/23	2/6/23


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Gantt



ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Task A/A	ПЕРІГРАФН ТАЅК	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
1	ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ	3	-
2	ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ	2	-
3	ΠΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ	2	T2
4	ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	3	T1,T2,T3
5	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ	1	T2
6	ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ MOCK UPS	5	T3
7	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	10	T6
8	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ	8	T6
9	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	8	T6
10	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up	5	T6
11	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Check-In	5	T6
12	ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	8	T6
13	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	8	Т9
14	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up	8	T10
15	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ CHECK-IN	8	T11
16	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	8	T12
17	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI	8	T8
18	ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	5	T13,T14,T15,T16
19	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ	1	T17,T18
20	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΓΗ	1	T19
21	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1	T20
22	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	1	T21


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT

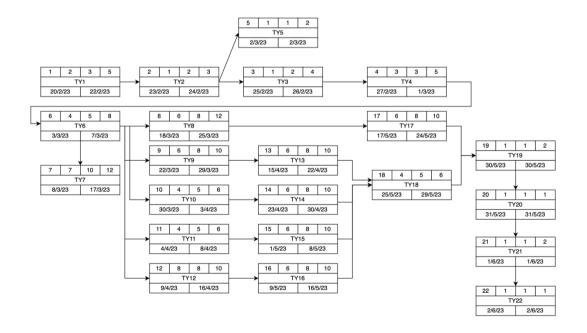


ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 Σύμφωνα με το αρχικό μας πλάνο όλα τα μέλη της ομάδας θα εργαστούν εξίσου σε κάθε υποέργο. Συνεπώς τα Gantt chart έχουν ως εξής.


ΒΕΛΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ




ΦΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΚΟΚΟΝΕΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ



ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΑ	
ΜΙΣΘΟΙ & ΑΜΟΙΒΕΣ	12.000€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	200€
ΕΡΓΑΛΕΙΑ	300€
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.000€
ΥΠΟΔΟΜΕΣ	2.000€
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ	500€
ΣΥΝΟΛΟ:	18.000€

1000 x 4(άτομα) x 3(μήνες)

• Εκτιμούμε το κόστος υπολογίζοντας τους μισθούς, την συντήρηση, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν(πχ. προγράμματα Microsoft Office), εξοπλισμός όπως υπολογιστές και περιφερικά, υποδομές για κάποιο γραφείο ή χώρο συνάντησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

- Microsoft Excel (Σχεδιασμός Gantt Chart, πίνακας task, εκτίμηση κόστους)
- Draw.io (Για τον σχεδιασμό του διαγράμματος PERT)
- Microsoft Word (Για την σύνταξη του αρχείου Project-plan)
- Discord & Skype (Για την επικοινωνία της ομάδας)
