Project-plan-v0.1



ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

| ONOMA | AM | email | ΕΤΟΣ |
|-------------------------|---------|---------------------|------|
| | | | |
| Βελγάκης Ιωάννης | 1047071 | up10477071@upnet.gr | 8 |
| Κοκονέλης Ανδρέας | 1064949 | up1064949@upnet.gr | 6 |
| Πιτσιγαυδάκης Εμμανουήλ | 1054405 | up1054405@upnet.gr | 7 |
| Φέλιος Ιωάννης | 1047086 | up1047086@upnet.gr | 8 |

Περιεχόμενα


| ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: | |
|-------------------------------|---|
| | |
| ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 3 |
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Gantt | 3 |
| ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ | 4 |
| | |
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT | 4 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | 5 |
| ΒΕΛΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΦΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΚΟΚΟΝΕΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 5 |
| ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ | |
| ENTINIZA NOZIOTZ | 0 |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ | 6 |

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

| ЕРГО | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | ENAPEH | ΛΗΞΗ |
|----------|-------------------|---------|--------|
| CheckInn | 102 | 20/2/23 | 2/6/23 |

| Task | | | | |
|------|------------------------------------|----------|---------|---------|
| A/A | ПЕРІГРАФН ТАЅК | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ENAPEH | VHEH |
| 1 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ | 3 | 20/2/23 | 22/2/23 |
| 2 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ | 2 | 23/2/23 | 24/2/23 |
| 3 | ΠΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ | 2 | 25/2/23 | 26/2/23 |
| 4 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 3 | 27/2/23 | 1/3/23 |
| 5 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ | 1 | 2/3/23 | 2/3/23 |
| 6 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ MOCK UPS | 5 | 3/3/23 | 7/3/23 |
| 7 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 10 | 8/3/23 | 17/3/23 |
| 8 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ | 8 | 18/3/23 | 25/3/23 |
| 9 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8 | 22/3/23 | 29/3/23 |
| 10 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up | 5 | 30/3/23 | 3/4/23 |
| 11 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Check-In | 5 | 4/4/23 | 8/4/23 |
| 12 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 8 | 9/4/23 | 16/4/23 |
| 13 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8 | 15/4/23 | 22/4/23 |
| 14 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up | 8 | 23/4/23 | 30/4/23 |
| 15 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ CHECK-IN | 8 | 1/5/23 | 8/5/23 |
| 16 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 8 | 9/5/23 | 16/5/23 |
| 17 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI | 8 | 17/5/23 | 24/5/23 |
| 18 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-GUI | 5 | 25/5/23 | 29/5/23 |
| 19 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ | 1 | 30/5/23 | 30/5/23 |
| 20 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΓΗ | 1 | 31/5/23 | 31/5/23 |
| 21 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 1 | 1/6/23 | 1/6/23 |
| 22 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 1 | 2/6/23 | 2/6/23 |


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Gantt



ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

| Task A/A | ПЕРІГРАФН ТАЅК | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΑΔΑΣ | 3 | - |
| 2 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ | 2 | - |
| 3 | ΠΡΟΤΩΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ | 2 | T2 |
| 4 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 3 | T1,T2,T3 |
| 5 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ | 1 | T2 |
| 6 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ MOCK UPS | 5 | T3 |
| 7 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 10 | T6 |
| 8 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ | 8 | T6 |
| 9 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8 | T6 |
| 10 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up | 5 | T6 |
| 11 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Check-In | 5 | T6 |
| 12 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 8 | T6 |
| 13 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8 | T9 |
| 14 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ Log In/Sign Up | 8 | T10 |
| 15 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ CHECK-IN | 8 | T11 |
| 16 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | 8 | T12 |
| 17 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI | 8 | T8 |
| 18 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 5 | T13,T14,T15,T16 |
| 19 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ | 1 | T17,T18 |
| 20 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΓΗ | 1 | T19 |
| 21 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 1 | T20 |
| 22 | ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 1 | T21 |


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT

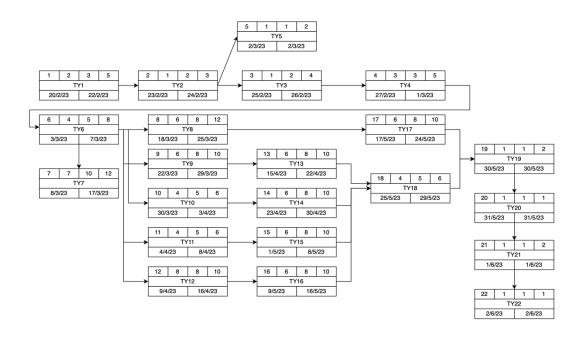


ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

• Σύμφωνα με το αρχικό μας πλάνο όλα τα μέλη της ομάδας θα εργαστούν εξίσου σε κάθε υποέργο. Συνεπώς τα Gantt chart έχουν ως εξής.


ΒΕΛΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ




ΦΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΚΟΚΟΝΕΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ



ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

| ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΑ | |
|------------------|---------|
| ΜΙΣΘΟΙ & ΑΜΟΙΒΕΣ | 12.000€ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 200€ |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ | 300€ |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 3.000€ |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 2.000€ |
| ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ | 500€ |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 18.000€ |

1000 x 4(άτομα) x 3(μήνες)

 Εκτιμούμε το κόστος υπολογίζοντας τους μισθούς, την συντήρηση, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν(πχ. προγράμματα Microsoft Office), εξοπλισμός όπως υπολογιστές και περιφερικά, υποδομές για κάποιο γραφείο ή χώρο συνάντησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

- Microsoft Excel (Σχεδιασμός Gantt Chart, πίνακας task, εκτίμηση κόστους)
- Draw.io (Για τον σχεδιασμό του διαγράμματος PERT)
- Microsoft Word (Για την σύνταξη του αρχείου Project-plan)
- Discord & Skype (Για την επικοινωνία της ομάδας)
